


## Sanierung Litschstrasse, Altendorf

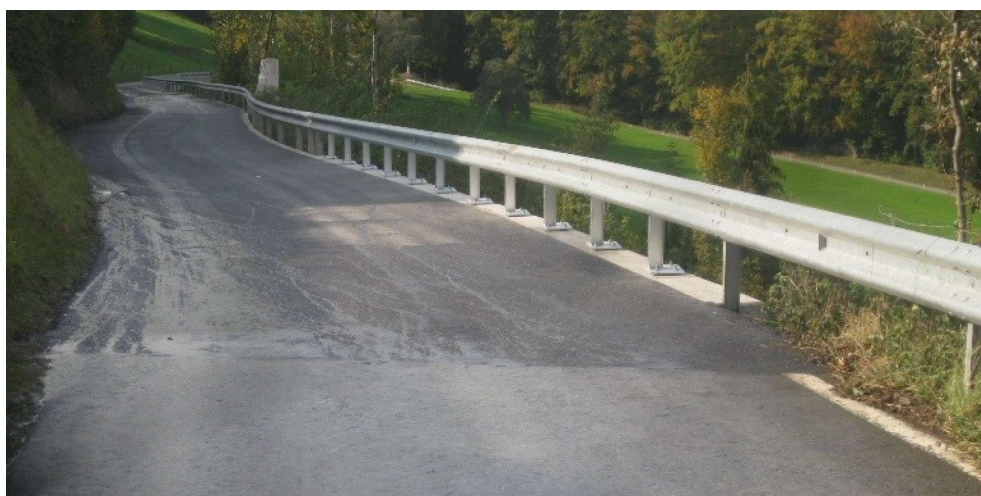

Zeitraum 2020  
Projektgrösse ca. 100'000.--

Auftraggeber Gemeinde Altendorf  
Planer HTB Ingenieure AG

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung  
Devisierung, Ausschreibung  
Ausführungsprojekt  
Örtliche Bauleitung  
Ausmass und Abrechnung

### PROJEKTBECHRIEB

In einem Teilbereich der Litschstrasse rutschte der bestehende Strassenrand ab. Im entsprechendem Strassenabschnitt wurde die Strasse mittels einer Betonmauer, beziehungsweise mit einem rückverankertem Betonriegel gesichert.  
Die Länge der Mauer/Betonriegel beträgt 25m und ist circa bis 1.50m hoch, eingebunden ins bestehende Erdreich.  
Die Fundationsschicht wurde örtlich ergänzt und auf der ganzen Länge ein neuer Belag eingebaut.  
Abschliessend wurde auf dem Strassenabschnitt eine Leitplanke moniert.
